



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

***Secretaría de Salud***  
***(SESAL)***

Al Tercer Trimestre, 2010

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Septiembre, 2010

### III. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIERA


#### 3.1 Inversión Pública al Tercer Trimestre

Honduras camina permanentemente por un importante riesgo que se manifiesta en una situación de transición epidemiológica, en la que coexisten enfermedades endémicas de tipo infecciosas, parasitarias y vectoriales, con las llamadas enfermedades emergentes como el VIH/Sida, lesiones, accidentes, enfermedades crónico degenerativas y las re-emergentes como la tuberculosis y malaria,<sup>1</sup> es por ello que la calidad de la salud debe ser considerada como un derecho ciudadano pues el Estado tiene la obligación de garantizar la provisión de servicios de calidad a la población y los individuos.

Por tanto, la Inversión realizada por la Secretaría de Salud está orientada a garantizar a toda la población el acceso a la atención integral que implica la puesta en ejecución de nuevas formas de atención, provisión, financiación y gestión de la salud incluyendo todas las redes sociales, en correspondencia con los escenarios demográficos, sociales, económicos, epidemiológicos y culturales que caracterizan la población nacional.

Para el presente año el presupuesto de inversión aprobado por el Congreso Nacional a la Secretaría de Salud (SESAL) ascendió a L.560,433.4 miles. Al Tercer Trimestre, el presupuesto vigente de esa Secretaría es de L.593,642.6 miles, incremento que obedece a la incorporación posterior a la aprobación del presupuesto del Proyecto Reforma del Sector Salud (PRSS) por un monto de L. 28,670.2 miles y de la Incorporación de Fondos de Alivio de Deuda (Modificación Presupuestaria Tipo 113, Documento No. 000018 con fecha 6 de abril, 2010) al proyecto de Paquete Básico de Servicios de Salud con Gestión Descentralizada por un valor de L.4,539.0 miles, para realizar Transferencia correspondiente al pago de Gestores de Salud de la Mancunidad MAFRON.

En términos porcentuales significa el 4.3% del Programa de Inversión Pública (PIP) y el 0.2% de Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para el presente año, para ejecutar 24 proyectos de inversión<sup>2</sup>, financiados con Fondos de Préstamos por el orden de L.268,023.8 miles (45.1%), Fondos del Club de Paris L.187,339.0 miles (31.6%), Fondos Nacionales L.128,179.8 miles (21.6%), y Fondos de Donación L.10,100.0 miles (1.7%). **Ver Gráfico No. 1**

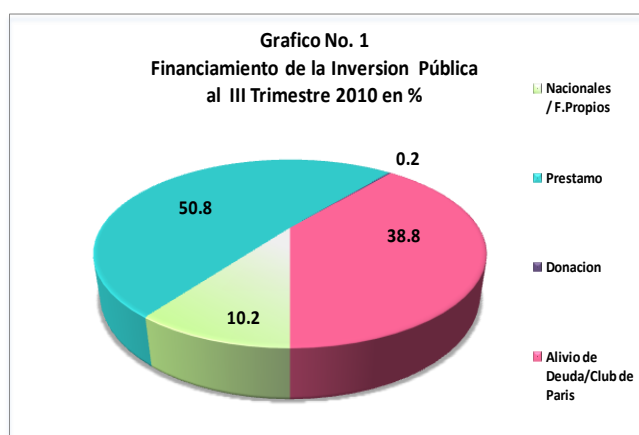

<sup>1</sup> Plan Nacional de Salud 2010-2014

<sup>2</sup> Se adjunta Anexo 7; Programa de Inversión Pública / Ejecución Financiera

Entre los proyectos que actualmente tiene en ejecución la SESAL, se encuentran varias construcciones, ampliaciones y remodelaciones a 5 Clínicas Materno Infantil y a los hospitales de Puerto Lempira en Gracias a Dios, San Francisco en Olancho, Salvador Paredes en Trujillo y Santa Bárbara Integrado en Santa Bárbara y uno de los más relevantes como es la Construcción y Equipamiento del Hospital Atlántida en la Ceiba, además cuenta con proyectos dirigidos a la Prevención y Promoción de la Salud, tales como: Invirtiendo en la Gente un País más Saludable y con Mejor Educación, Atención Integral a Grupos Vulnerables, Control de la Enfermedad de Chagas, Mejoramiento del Nivel de Salud en Honduras, Nutrición y Protección Social entre otros, destinándose para Inversión Real (infraestructura, obras y equipos) L.414,497.0 miles (69.8%) y en Desarrollo Humano (promoción, protección, mejora y ampliación de la cobertura de los servicios de salud) L.179,145.6 miles (30.2%).

### 3.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Tercer Trimestre 2010

Al Tercer trimestre la Secretaría de Salud alcanzó una ejecución financiera de 47.0% (L.278,725.7 miles), de los cuales 50.8% (L.141,709.0 miles) corresponden a Fondos de Préstamos, seguido de un 38.8% (L.108,252.7 miles) de Fondos de Alivio de la Deuda, 10.2% (L.28,351.6 miles) de Fondos Nacionales y 0.2% (L.412.4 miles) de Fondos de Donación.

CUADRO No. 14  
Proyectos Estratégicos de La Secretaría de Salud  
Al 30 de Septiembre, 2010  
Miles de Lempiras

| No. | Proyecto                                                         | Organismo Financiador | Presupuesto Vigente | Ejecución al III Trimestre, 2010 | % de Ejecución |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|
| 24  | Secretaría de Salud                                              |                       | 593,642.6           | 278,725.7                        | 47.0           |
| 5   | Proyectos Estratégicos                                           |                       | 500,506.5           | 268,747.7                        | 53.7           |
| 1   | Pro-Reforma del Sector Salud */                                  | BM                    | 28,670.2            | 19,685.6                         | 68.7           |
| 2   | Mejoramiento del Nivel de Salud en Honduras                      | BM                    | 71,820.0            | 5,308.5                          | 7.4            |
| 3   | Construcción y Equipamiento del Hospital Atlántida               | COREA                 | 118,265.7           | 100,905.0                        | 85.3           |
| 4   | Paquete Básico de Servicios de Salud con Gestión Descentralizada | ALIVIO DE DEUDA       | 204,199.2           | 116,389.5                        | 57.0           |
| 5   | Nutrición y Protección Social                                    | BID                   | 77,551.4            | 26,459.1                         | 34.1           |
| 19  | Otros Proyectos                                                  |                       | 93,136.1            | 9,978.0                          | 10.7           |

\*/ Proyecto incorporado posterior a la aprobación del Presupuesto 2010. Fuente: SIAFI

Desde la perspectiva institucional, la ejecución de los proyectos se encuentra concentrada en cinco proyectos estratégicos detallados en el **Cuadro No. 14**, mismos que contribuyen a la generación de impacto en la promoción, prevención y extensión de la cobertura de los servicios de salud, tales como: Pro- Reforma del Sector Salud, Nutrición y Protección Social, Paquete Básico de Servicios de Salud con Gestión Descentralizada, Construcción y Equipamiento del Hospital Atlántida y Programa de Mejoramiento del Sector Salud en Honduras.

El presupuesto para estos proyectos ascendió a L.500,506.5 miles (84.3% del presupuesto aprobado a la SESAL) alcanzando al tercer trimestre una ejecución de 53.7% (L.268,747.7 miles) según el SIAFI, por lo que cualquier retraso en la ejecución de los mismos afecta considerablemente la ejecución global de la institución.

Así mismo, la SESAL ejecuta el proyecto **Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas**, con un monto de L.15.1 millones donación de la Cooperación Japonesa. La chinche *Triatoma Dimidiata* ha atacado a unos 220 mil hondureños según estudio de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), la mayoría de habitantes afectados provienen de los sectores más pobres del país. Al tercer trimestre se han rociado 7,711 viviendas en los departamentos de: Ocotepeque, Copán, Lempira, Intibucá, Francisco Morazán, Comayagua, Yoro y El Paraíso.<sup>3</sup>

Dentro de los principales logros obtenidos por los proyectos estratégicos al tercer trimestre se encuentran:

- El Proyecto **Reforma del Sector Salud**, concluyó las obras de rehabilitación de cuatro hospitales en Yoro, Tocoa, El Progreso, San Lorenzo, así mismo finalizó el equipamiento de las clínicas periféricas del IHSS para la implantación del Programa de Atención Integral de Salud a la Familia y a la Comunidad (PAISFC), proyecto finalizado el 30 de septiembre.



Vista de uno de los pasillos remodelados por el Proyecto Reforma del Sector Salud en el Hospital del Progreso

- El Proyecto **Mejoramiento del Nivel de Salud en Honduras (PROMESALUDH)**, tiene en funcionamiento 4 Clínicas Materno Infantiles en las comunidades de La Entrada, Copán; San Miguelito y Jesús de Otoro en Intibucá y Santiago de Puringla en el departamento de La Paz. Actualmente se están preparando los Terminos de Referencia para iniciar los procesos de Licitación de las 5 Clínicas



Fachada de la Clínica Materno Infantil 'Nueva Vida' en Santiago d Puringla, La Paz

<sup>3</sup> Se Adjunta Anexo 8, Programa de Inversión Pública / Ejecución Física

que faltan por construir en: Ahuanqueterique, Tambla, El Paraíso, Adea de Azacualpa y Lepaera.

- El Proyecto **“Construcción y equipamiento del Hospital Regional de Atlántida”** se encuentra en proceso de cierre, alcanzando una ejecución física de 100%, el mismo fue recepcionado por las Autoridades de las SESAL en el mes de septiembre.



Vista de uno de los 8 Pabellones del Nuevo Hospital Atlántida

- Entrega a 498,234 personas de los servicios del **Paquete Básico de Salud** cubriendo: inmunizaciones, atención integral al niño, atención al recién nacido y atención en morbilidad, así mismo se han atendido 4,555 partos institucionales.
- Implementación de la Estrategia Atención Integral al Niño en la Comunidad (AIN-C) a través del **Proyecto Nutrición y Protección Social**, en 773 comunidades con la participación de 12,127 niños menores de 2 años y 11,700 madres, en 63 Municipios de los departamentos de La Paz, Intibucá, Ocotepeque, El Paraíso, Lempira y Copán en 1,038 Caseríos.

### 3.3 Ejecución por Departamentos

A nivel departamental la ejecución de la SESAL se concentra en forma mayoritaria en los departamentos de Atlántida, Francisco Morazán, Lempira, La Paz, Intibucá y Choluteca, con un total de L.504,287.6 miles (84.9%) del presupuesto vigente, priorizando intervenciones como la Construcción y Equipamiento del Hospital Atlántida (L.118,265.7 miles) con una ejecución del 85.3%, localizado en la ciudad de La Ceiba.

El departamento de Choluteca muestra una ejecución de 52.5% en proyectos cuya finalidad principal es contribuir en la reducción de la tasa de desnutrición estableciendo un Sistema de Vigilancia del Estado Nutricional basado en los nuevos estándares a nivel de comunidad como medida preventiva para reducir la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años, así como atención a la mujer (embarazo, parto, puerperio y vacunación) entre estos proyectos se encuentran: Atención Integral a Grupos Vulnerables con intervención en 12 municipios en los que se logró atender 5,893 niños y 602 mujeres embarazadas y la entrega del Paquete Básico de Servicios de Salud con Gestión Descentralizada.

## SECRETARIA DE FINANZAS

Por otro lado, los departamentos de Lempira, Francisco Morazán, La Paz e Intibucá alcanzaron una ejecución entre el 38.3 y el 42.6% con un presupuesto vigente de L.331,233.7 miles, sobresaliendo los proyectos de Paquete Básico de los Servicios de Salud, Nutrición y Protección Social y el Proyecto de Mejoramiento del Nivel de Salud en Honduras. **Ver Cuadro No. 15**

**CUADRO No.15**  
**SECRETARIA DE SALUD**  
**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010**  
**(En Miles de Lempiras)**

| No.          | Departamento      | Vigente al III Trimestre |                  |                  | Devengado al III Trimestre |                  |                  | % Ejecución |
|--------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|-------------|
|              |                   | Nacionales               | Externos         | Total            | Nacionales                 | Externos         | Total            |             |
| 1            | Atlántida         | 6,000.0                  | 112,265.7        | 118,265.7        |                            | 100,905.0        | 100,905.0        | 85.3        |
| 2            | Colón             | 3,046.6                  |                  | 3,046.6          |                            |                  |                  |             |
| 3            | Copán             | 1,195.6                  | 23,931.2         | 25,126.8         | 32.7                       | 5,293.5          | 5,326.2          | 21.2        |
| 4            | Choluteca         | 7,953.5                  | 46,834.7         | 54,788.2         | 1,693.0                    | 27,063.2         | 28,756.2         | 52.5        |
| 5            | El Paraíso        | 8,782.1                  | 6,955.0          | 15,737.1         | 613.6                      | 1,858.9          | 2,472.5          | 15.7        |
| 6            | Francisco Morazán | 37,192.8                 | 54,215.5         | 91,408.3         | 17,635.3                   | 19,945.7         | 37,581.0         | 41.1        |
| 7            | Gracias a Dios    | 19,835.8                 |                  | 19,835.8         | 3,967.2                    |                  | 3,967.2          | 20.0        |
| 8            | Intibucá          | 8,614.5                  | 71,627.9         | 80,242.4         | 1,286.1                    | 29,435.7         | 30,721.8         | 38.3        |
| 9            | La Paz            | 6,851.3                  | 68,995.7         | 75,847.0         | 837.7                      | 30,033.8         | 30,871.5         | 40.7        |
| 10           | Lempira           | 8,407.1                  | 75,328.9         | 83,736.0         | 1,077.6                    | 34,605.5         | 35,683.1         | 42.6        |
| 11           | Ocotepeque        | 1,433.1                  | 5,308.3          | 6,741.4          | 125.6                      | 1,232.7          | 1,358.3          | 20.1        |
| 12           | Olancho           | 4,600.3                  |                  | 4,600.3          |                            |                  |                  |             |
| 13           | Santa Bárbara     | 3,443.8                  |                  | 3,443.8          |                            |                  |                  |             |
| 14           | Valle             | 4,980.1                  |                  | 4,980.1          |                            |                  |                  |             |
| 15           | Yoro              | 5,843.1                  |                  | 5,843.1          | 1,082.9                    |                  | 1,082.9          | 18.5        |
| <b>TOTAL</b> |                   | <b>128,179.7</b>         | <b>465,462.9</b> | <b>593,642.6</b> | <b>28,351.7</b>            | <b>250,374.0</b> | <b>278,725.7</b> | <b>47.0</b> |

Fuente: SIAFI

### 3.4 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos

Se han presentado diversos problemas que han afectado la ejecución de los proyectos, entre ellos:

- El proyecto de Mejoramiento del Nivel de Salud en Honduras (PROMESALUDH) presenta una ejecución del 7.4% en vista que durante el año 2010, la UE se ha dedicado a la presentación del informe de la Auditoría de Certificación de Gastos de Recursos Humanos, en cumplimiento a lo establecido en el convenio de préstamo dado que es un requisito para optar al primer desembolso del año 2010, correspondiente al segundo tramo, debido a que este se ejecuta "en base a resultados" lo que no ha permitido el alcance de las metas programadas en el tiempo definido para tal fin.
- En relación a los proyectos que se financian con fondos nacionales, el Programa Nacional de Servicios del Sector Salud (PRONASSA) encargada de la Supervisión informó que los atrasos en la ejecución se deben a los procesos de Licitación que dieron inicio el pasado 10 de agosto con la

invitación a licitar públicamente por un monto de L36,583.0 miles. Las ofertas se abrieron el 3 de septiembre y se recibieron 87 ofertas. El día 25 de Septiembre se firmó la recomendación de adjudicación y se prevé que en el mes de octubre se emitan las Resoluciones Ministeriales y notificaciones de las adjudicaciones respectivas.

■ El proyecto Paquete Básico de Servicios de Salud con Gestión Descentralizada, enfrenta problemas con el pago de algunos gestores, dicho atraso significa el no cumplimiento de lo estipulado en el contrato, lo que está ocasionando problemas para cubrir todas las necesidades desde pago de salarios, compra de medicamentos e insumos y atraso en actividades de campo. La Unidad Ejecutora solicitó presupuesto adicional por el monto de L.70,000.0 miles para cubrir estas necesidades sin embargo no se han podido solventar en vista que actualmente no se cuenta con disponibilidad de fondos, dado que este proyecto es financiado con fondos de Alivio de Deuda.

#### **IV. CONCLUSIONES**

1. Persiste la falta de coordinación entre la UPEG, PRONASSA y la Unidad de Extensión, Cobertura y Financiamiento (UECF) de la Secretaría de Salud en cuanto a la información que brindan a la Secretaría de Finanzas, dado que no es oportuna y muchas veces presenta inconsistencias.
2. La ejecución al tercer trimestre 2010 de los proyectos de la Secretaría de Salud refleja una ejecución de tan sólo un 47.0% esto debido a los procesos tardíos en las Licitaciones de 8 proyectos aproximadamente, que abarcan la construcción y equipamiento de Clínicas Materno Infantiles, reparaciones de sistemas de agua, sustitución de techos en varios hospitales, así como la construcción de 4 Oficinas Departamentales, todos estos de carácter prioritario para brindar un mejor servicio.
3. Además que los atrasos en la ejecución de los proyectos están estrechamente relacionados a la tardanza en los procesos administrativos que ingresan para su aprobación a la Secretaría General de la SESAL, así mismo la rotación del personal que ocupa los puestos claves afecta considerablemente el tiempo de ejecución de los mismos.

#### **V. RECOMENDACIONES**

1. Es recomendable establecer mecanismos que agilicen los procesos directamente relacionados con los proyectos y además que el personal responsable en cada Unidad Ejecutora dé el seguimiento constante en la

Secretaría General hasta obtener las autorizaciones correspondientes a dichos procesos.

2. Encontrar un mecanismo en el que se pueda consensuar la información que se brinda por parte de las diferentes instancias de la Secretaría de Salud, lo que vendría a contribuir con una toma de decisiones oportuna por parte de las Autoridades.
3. Respecto al Proyecto mejoramiento del Nivel de Salud en Honduras, la Unidad Ejecutora debe suscribir el contrato de Auditoría concurrente del proyecto e iniciar el proceso de licitación de las clínicas para que avance la ejecución de las obras, además que con ese fin primordial se está llevando acabo la reformulación del proyecto para lograr las metas programadas.

GOBIERNO DE HONDURAS  
SECRETARÍA DE FINANZAS  
Dirección General de Inversiones Públicas  
Institución: SECRETARÍA DE SALUD (60)

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL 30 de SEPTIEMBRE, 2010  
Miles de Lempiras

ANEXO No. 7

| No. | Nombre del Proyecto                                                                                                                                  | Inicio-Termino | Organismos Financiado | Presupuesto_Aprobado |                 |           | Presupuesto_Vigente |                 |           | DEVENGADO         |                 |          |                            |                 |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------|---------------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------------|----------|----------------------------|-----------------|-----------|
|     |                                                                                                                                                      |                |                       | Fondos Nacionales    | Fondos Externos | Total     | Fondos Nacionales   | Fondos Externos | Total     | III TRIMESTRE     |                 |          | ACUMULADO AL III TRIMESTRE |                 |           |
|     |                                                                                                                                                      |                |                       |                      |                 |           |                     |                 |           | Fondos Nacionales | Fondos Externos | Total    | Fondos Nacionales          | Fondos Externos | Total     |
| 24  | 60 - Secretaría de Salud                                                                                                                             |                |                       | 125,967.3            | 434,466.1       | 560,433.4 | 128,179.8           | 465,462.8       | 593,642.6 | 14,184.1          | 74,638.3        | 88,822.3 | 28,351.6                   | 250,374.1       | 278,725.7 |
| 1   | Pro-Reforma del Sector Salud                                                                                                                         | 2007-2010      | BM<br>IDA 3640        | -                    | -               | -         | 2,212.5             | 26,457.6        | 28,670.1  | -                 | -               | -        | 2,212.5                    | 17,473.1        | 19,685.6  |
| 2   | Mejoramiento del Nivel de Salud en Honduras                                                                                                          | 2003-2010      | BID<br>1619           | 7,560.0              | 64,260.0        | 71,820.0  | 7,560.0             | 64,260.0        | 71,820.0  | -                 | -               | -        | 4,632.1                    | 676.4           | 5,308.5   |
| 3   | Construcción y Equipamiento del Hospital Atlántida                                                                                                   | 2003-2010      | Corea<br>HND-1003     | 6,000.0              | 112,265.7       | 118,265.7 | 6,000.0             | 112,265.8       | 118,265.8 | -                 | -               | -        | -                          | 100,905.0       | 100,905.0 |
| 4   | Invirtiendo en la Gente, un País mas Saludable y con Mejor Educación                                                                                 | 2003-2010      | USAID<br>522-0433     | 6,500.0              | -               | 6,500.0   | 6,500.0             | -               | 6,500.0   | -                 | -               | -        | 331.4                      | -               | 331.4     |
| 5   | Control de Enfermedad de Chagas de la República de Honduras                                                                                          | 2009-2010      | Japón                 | 5,000.0              | 10,100.0        | 15,100.0  | 5,000.0             | 10,100.0        | 15,100.0  | -                 | -               | -        | 1,754.0                    | 412.4           | 2,166.4   |
| 6   | Paquete Básico de Servicios de Salud con Gestión Descentralizada                                                                                     | 2007-2010      | Italia                | 16,860.2             | 182,800.0       | 199,660.2 | 16,860.2            | 187,339.0       | 204,199.2 | -                 | -               | -        | 8,136.8                    | 108,252.7       | 116,389.5 |
| 7   | Construcción de la Primera Etapa de la Consulta Externa del Hospital Puerto Lempira, Mosquitia Hondureña                                             | 2007-2010      | GOB HON               | 12,485.9             | -               | 12,485.9  | 12,485.9            | -               | 12,485.9  | 743.4             | -               | 743.4    | 3,967.2                    | -               | 3,967.2   |
| 8   | Construcción de la Morgue en el Hospital Puerto Lempira, Mosquitia Hondureña                                                                         | 2007-2010      | GOB HON               | 1,402.6              | -               | 1,402.6   | 1,402.6             | -               | 1,402.6   | 1,324.1           | -               | 1,324.1  | -                          | -               | -         |
| 9   | Construcción del Albergue para la Atención de Pacientes Conviviendo con el Virus de Inmuno Deficiencia Humana en Puerto Lempira, Mosquitia Hondureña | 2007-2010      | GOB HON               | 5,947.3              | -               | 5,947.3   | 5,947.3             | -               | 5,947.3   | -                 | -               | -        | -                          | -               | -         |
| 10  | Atención Integral a Grupos Vulnerables                                                                                                               | 2007-2011      | GOB HON               | 4,000.0              | -               | 4,000.0   | 4,000.0             | -               | 4,000.0   | -                 | -               | -        | 1,106.0                    | -               | 1,106.0   |
| 11  | Nutrición y Protección Social                                                                                                                        | 2007-2010      | BM<br>IDA 4097        | 12,511.0             | 65,040.4        | 77,551.4  | 12,511.0            | 65,040.4        | 77,551.4  | 3,967.2           | -               | 3,967.2  | 3,804.6                    | 22,654.5        | 26,459.1  |
| 12  | Remodelación de la Cocina del Hospital Santa Bárbara                                                                                                 | 2007-2011      | GOB HON               | 500.0                | -               | 500.0     | 500.0               | -               | 500.0     | 338.1             | -               | 338.1    | -                          | -               | -         |
| 13  | Reposición del Sistema de Agua Potable del Hospital de Santa Bárbara Integrado                                                                       | 2007-2011      | GOB HON               | 1,408.8              | -               | 1,408.8   | 1,408.8             | -               | 1,408.8   | 261.3             | -               | 261.3    | -                          | -               | -         |
| 14  | Sustitución del Techo del Hospital Dr. Salvador Paredes                                                                                              | 2004-2011      | GOB HON               | 3,046.6              | -               | 3,046.6   | 3,046.6             | -               | 3,046.6   | -                 | -               | -        | -                          | -               | -         |
| 15  | Reposición de Techos del Hospital Santa Bárbara                                                                                                      | 2007-2011      | GOB HON               | 1,535.0              | -               | 1,535.0   | 1,535.0             | -               | 1,535.0   | -                 | -               | -        | -                          | -               | -         |
| 16  | CAI- Construcción del Centro de Atención Integral para Pacientes Viviendo con VIH/SIDA Hospital San Francisco                                        | 2009-2012      | GOB HON               | 2,317.8              | -               | 2,317.8   | 2,317.8             | -               | 2,317.8   | -                 | -               | -        | -                          | -               | -         |
| 17  | Ampliación y Reorganización de la Sala de Cirugía del Hospital San Francisco de Juticalpa, Olancho                                                   | 2009-2010      | GOB HON               | 2,282.5              | -               | 2,282.5   | 2,282.5             | -               | 2,282.5   | -                 | -               | -        | -                          | -               | -         |
| 18  | Construcción de la Departamental de Choluteca                                                                                                        | 2006-2011      | GOB HON               | 6,620.5              | -               | 6,620.5   | 6,620.5             | -               | 6,620.5   | 2,480.5           | 676.3           | 3,156.8  | 1,324.1                    | -               | 1,324.1   |
| 19  | Construcción/Remodelación Bodegas y Oficinas Administrativas de El Paraiso                                                                           | 2005-2010      | GOB HON               | 6,000.0              | -               | 6,000.0   | 6,000.0             | -               | 6,000.0   | 827.8             | -               | 827.8    | -                          | -               | -         |
| 20  | Construcción/Remodelación Bodegas y Oficinas Administrativas de Intibucá                                                                             | 2007-2010      | GOB HON               | 4,380.2              | -               | 4,380.2   | 4,380.2             | -               | 4,380.2   | -                 | -               | -        | -                          | -               | -         |
| 21  | Construcción/Remodelación Bodegas y Oficinas Administrativas de La Paz                                                                               | 2008-2010      | GOB HON               | 4,022.3              | -               | 4,022.3   | 4,022.3             | -               | 4,022.3   | -                 | -               | -        | -                          | -               | -         |
| 22  | Construcción/Remodelación Bodegas y Oficinas Administrativas de Lempira                                                                              | 2008-2010      | GOB HON               | 4,763.4              | -               | 4,763.4   | 4,763.4             | -               | 4,763.4   | 1,503.7           | 11,372.0        | 12,875.6 | -                          | -               | -         |
| 23  | Construcción de las Oficinas Administrativas de la Región Departamental de Salud No. 17 de Valle                                                     | 2008-2010      | GOB HON               | 4,980.1              | -               | 4,980.1   | 4,980.1             | -               | 4,980.1   | -                 | 17,473.1        | 17,473.1 | -                          | -               | -         |
| 24  | Construcción/Remodelación Bodegas y Oficinas Administrativas de la Departamental de Yoro                                                             | 2008-2010      | GOB HON               | 5,843.1              | -               | 5,843.1   | 5,843.1             | -               | 5,843.1   | 2,738.0           | 45,116.8        | 47,854.8 | 1,082.9                    | -               | 1,082.9   |

GOBIERNO DE HONDURAS  
SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas  
Institución: SECRETARIA DE SALUD (60)

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FISICA AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2010

ANEXO No. 8

| No. | Nombre del Programa / Proyecto              | Meta                                                                         | Unidad de Medida          | Meta Global                  | Programado 2010              |                  | Ejecutado 2010   |             | Población Beneficiaria | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                             |                                                                              |                           |                              | Anual                        | Al III Trimestre | Al III Trimestre | % Ejecución |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24  | SECRETARÍA DE SALUD                         |                                                                              |                           |                              |                              |                  |                  |             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1   | Pro-Reforma del Sector Salud                | Equipamiento básico                                                          | No. de Clínicas           | 14                           | -                            | -                | -                | -           | 600,000                | En etapa de cierre de proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2   | Mejoramiento del Nivel de Salud en Honduras | Construcción de 5 Clínicas Materno Infantiles y 4 Hogares Materno Infantiles | Clínicas Hogares Maternos | 9 Clínicas 4 Hogares Materno | 5 Clínicas 4 Hogares Materno |                  | -                | -           | 950,000                | <p>1.-El tipo de proyecto "ejecución en base a resultados" no ha permitido el avance en el logro de las metas.</p> <p>2.-El BID tiene previsto realizar el primer desembolso en el mes de octubre, en vista de esto la UE está iniciando la preparación de los terminos de referencia para el proceso de licitación para la construcción de las 5 Clínicas y los 4 Hogares Materno Infantiles en las comunidades de: Ahuanqueterique, Tambla, El Paraiso, Adea de Azacualpa y Lepaera.</p> <p>3. Está en proceso de elaboración del segundo informe de la Auditoria de Desempeño para el Tramo 2.</p> <p>Aun no han recibido ambos desembolsos de \$6.6 millones por parte del BID.</p> <p>El proyecto cuenta con el POA y PAC 2010</p> <p>Recomendación:</p> <p>En vista que durante el año en curso no hay avances fisicos relevantes por toda la problemática que ha tenido el proyecto, se nombró nuevo recurso humano, dado esto se espera que el proceso de licitación se lleve en tiempo y forma.</p> |

## GOBIERNO DE HONDURAS

## SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas

Institución: SECRETARIA DE SALUD (60)

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FISICA AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2010

ANEXO No. 8

| No. | Nombre del Programa / Proyecto                     | Meta                       | Unidad de Medida    | Meta Global | Programado 2010 |                  | Ejecutado 2010   |             | Población Beneficiaria | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                    |                            |                     |             | Anual           | Al III Trimestre | Al III Trimestre | % Ejecución |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3   | Construcción y Equipamiento del Hospital Atlántida | Construcción, equipamiento | m2<br>(% de avance) | 12,500      | 100%            | 100%             | 100%             | -           | 344,099                | <p>En el mes de Septiembre una Comisión conformada por el Programa Nacional de Servicios de Salud (PRONASSA), representantes de Auditoría Interna de la Secretaría de Salud, Bienes Nacionales, Unidad de Equipamiento de la SESAL y en presencia de uno de los Consultores Coreanos, se realizó la inspección y reconocimiento de cada uno de los bloques y sus respectivos ambientes con el propósito de realizar la Recepción del Nuevo Hospital Atlántida, dentro de los principales hallazgos se encontraron:</p> <p>1.-Pendiente el Diseño y construcción de la Planta de tratamiento de aguas negras.</p> <p>2.-Diseño y Construcción de calle pavimentada de acceso al Hospital.</p> <p>3.- Pendiente el Diseño y construcción de los canales de drenaje de la Laguna circundante.</p> <p>4.- El voltaje en la entrada del hospital entregado por la ENEE, presenta fluctuaciones en vista que se trata de una red de energía compartida con múltiples usuarios residenciales, comerciales, industriales y otros, situación que pone en riesgo la vida de los delicados equipos con que cuenta el hospital.</p> <p>Recomendación:</p> <p>Según la Comisión que realizó la inspección final al hospital y dada la necesidad de los habitantes de esa zona, los hallazgos encontrados In Situ, no deberán interpretarse como una limitante para poner en funcionamiento en el menor tiempo posible el hospital, dado que se pueden desarrollar paralelamente los trabajos de acabados finales y servicios básicos.</p> |

GOBIERNO DE HONDURAS

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas

Institución: SECRETARIA DE SALUD (60)

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FISICA AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2010

ANEXO No. 8

| No. | Nombre del Programa / Proyecto                                                                                                                       | Meta                                                          | Unidad de Medida  | Meta Global | Programado 2010 |                  | Ejecutado 2010   |             | Población Beneficiaria | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                      |                                                               |                   |             | Anual           | Al III Trimestre | Al III Trimestre | % Ejecución |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4   | Invertiendo en la Gente, un País mas Saludable y con Mejor Educación                                                                                 | Vigilancia epidemiologica en enfermedades infecciosas/SIDA    | Personas          | 4,209       | 2,869           | -                | -                | -           | 2,966,525              | 1. La auditoría del proyecto al 31 de diciembre de 2009, cuestionó ciertos gastos por un monto aproximado de L330,000 y la UECF tuvo que procesar transferencias presupuestarias para poder reembolsar a la USAID dicho monto. El informe de la auditoría se conoció en junio de 2010 y el reembolso se completó el 13 de septiembre de 2010.<br>2. Debido a las razones anteriores, el proyecto no tuvo ejecución durante los primeros 3 trimestres del año 2010<br>3. Actualmente la USAID tiene en proceso de firma una carta de ejecución que hace disponibles L14.7 millones para la SESAL. Este monto está programado para ser invertido por la SESAL antes del 31 de marzo de 2011.<br>4. La USAID y el Gobierno de Honduras han firmado el nuevo Convenio de Asistencia por un total de \$49 millones (\$38 millones en fondos de donación y \$11 en fondos de contraparte, incluyendo contribuciones en especie) por un período de cuatro años iniciando en 2011. |
| 5   | Control de Enfermedad de Chagas de la República de Honduras                                                                                          | Rociar Viviendas para R. prolixus                             | No. de Viviendas  | 176,753     | 40,000          | 15,000           | 7,711            | 51.41       | 3,433,966              | 1500 menores de 15 años con diagnóstico serológico fueron atendidos por el personal de laboratorio central (Chagas y Malaria), técnicos de JICA y 2 Técnicos en Salud Ambiental del departamento de Francisco Morazán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6   | Paquete Básico de Servicios de Salud con Gestión Descentralizada                                                                                     | Atención en modelos descentralizados y partos institucionales | No. de atenciones | 867,000     | 735,141         | 595,000          | 498,234          | 67.77       | 2,058,792              | 1.-La meta de personas atendidas fue reprogramada de 855,000 a 735,141 personas, debido a la falta de financiamiento lo que no permitió la descentralizaron de algunos servicios de salud previstos.<br>2.-Por falta de financiamiento no se abrieron algunas Clínicas Materno Infantiles previstas y tres de ellas iniciaron atención de parto hasta el segundo semestre 2010 por falta de equipamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7   | Construcción de la Primera Etapa de la Consulta Externa del Hospital Puerto Lempira, Mosquitia Hondureña                                             | Construcción de edificio                                      | m2                | 859         | 859             | -                | -                | -           | 83,371                 | Contrato firmado y garantías presentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8   | Construcción de la Morgue en el Hospital Puerto Lempira, Mosquitia Hondureña                                                                         | Construcción de edificio                                      | m2                | 102.02      | 102.02          | -                | -                | -           | 83,371                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9   | Construcción del Albergue para la Atención de Pacientes Conviviendo con el Virus de Inmuno Deficiencia Humana en Puerto Lempira, Mosquitia Hondureña | Construcción de edificio                                      | m2                | 323.44      | 323.44          | -                | -                | -           | 83,371                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## GOBIERNO DE HONDURAS

## SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas

Institución: SECRETARIA DE SALUD (60)

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FISICA AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2010

ANEXO No. 8

| No. | Nombre del Programa / Proyecto                                                                                | Meta                                                                                         | Unidad de Medida                                               | Meta Global | Programado 2010 |                  | Ejecutado 2010   |             | Población Beneficiaria      | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                               |                                                                                              |                                                                |             | Anual           | Al III Trimestre | Al III Trimestre | % Ejecución |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10  | Atención Integral a Grupos Vulnerables                                                                        | Vigilancia y evaluación nutricional                                                          | Número de niños (menores de cinco años)                        | 6,000       | 6,000           | -                | 6,617            | 110.28      | 24,000                      | Las transferencias se solicitan en dos partes, la primera a ejecutarse en el primer semestre la cual se pidió mediante Oficio numero 015- de fecha 23 de abril del 2010, la cual fue aprobada y acreditada a la cuenta del Programa Mundial de Alimentos en fecha 9 de junio del 2010, con numero de LOTE 228.<br><br>Se solicitará la segunda transferencia, ya que se está en espera de la documentacion que el PMA debe enviar para su tramitacion.                                                                                                               |
|     |                                                                                                               | Atención Integral a la niñez a nivel comunitario                                             | Número de niños atendidos                                      | 6,000       | 6,000           | -                | 6,617            | 110.28      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                               | Alimentacion Complementaria y Nutricional a Mujeres y Niños                                  | Número de niños y mujeres                                      | 6,000       | 6,000           | -                | 725              | 12.08       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                               | Participación social, municipal y comunitaria                                                | Número de Municipios (con sistema de vigilancia en sus planes) | 35          | 35              | -                | 17               | 48.57       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11  | Nutrición y Protección Social                                                                                 | Implementación, registro y aplicación del AIN-C (Atención Integral del niño en la Comunidad) | Comunidades                                                    | 1,000       | 1,000           | 500              | 773              | 77.3        | 122,000 niños de 0 a 5 años | El cumplimiento de metas programados cada trimestre es referida a comunidades, en el 2010 se reinició con las 773 comunidades identificadas para AINC, los contratos con proveedores se firmaron en el 2009 con ampliación de plazo a Noviembre del 2010; estos continuan con la prestación de servicios AINC, se espera se firmen nuevamente los contratos y se amplien por 12 meses adicionales; la única región que tiene el personal técnico completo es La Paz, las demás regiones tienen en proceso la contratación. El proyecto cuenta con el POA y PAC 2010. |
| 12  | Remodelación de la Cocina del Hospital Santa Bárbara                                                          | Construcción de edificio                                                                     | m2                                                             | 336.98      | -               | -                | -                | -           | 382,014                     | El Programa Nacional de Servicios del Sector Salud (PRONASSA) no envió información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13  | Reposición del Sistema de Agua Potable del Hospital de Santa Bárbara Integrado                                | Sistema de conducción de agua potable                                                        | No. de Sistemas de Agua                                        | 1           | 1               | -                | -                | -           | 382,014                     | En proceso para firma de contrato. Resolución 155-2010-SS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14  | Sustitución del Techo del Hospital Dr. Salvador Paredes                                                       | Reparación del techo del área de hospitalización                                             | m                                                              | 16.5 x 69.8 | 16.5 x 69.8     | -                | -                | -           | 140,254                     | Se encuentra en proceso de Licitación Pública, con la Empresa SICMER. Resolución 170-2010-SS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15  | Reposición de Techos del Hospital Santa Bárbara                                                               | Sustitución de láminas de asbestos por aluzinc                                               | m2                                                             | 2,464       | 2,464           | -                | -                | -           | 388,572                     | En proceso para firma de contrato. La empresa contratista es COPASA. S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16  | CAI- Construcción del Centro de Atención Integral para Pacientes Viviendo con VIH/SIDA Hospital San Francisco | Construir y equipar                                                                          | m2                                                             | 221         |                 | -                | -                | -           | 478,580                     | Proyecto en proceso licitación pública. Resolución No. 171-2010-SS con la Empresa DICONSET S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17  | Ampliación y Reorganización de la Sala de Cirugía del Hospital San Francisco de Juticalpa, Olancha            | Ampliación, reorganización y construcción                                                    | m2                                                             | 150.75 m2   |                 | -                | -                | -           | 478,580                     | Proyecto en proceso licitación pública. Resolución No. 168-2010-SS con la Empresa Construcciones Rodríguez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**GOBIERNO DE HONDURAS**  
**SECRETARIA DE FINANZAS**

Dirección General de Inversiones Públicas  
Institución: SECRETARIA DE SALUD (60)

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FISICA AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2010

**ANEXO No. 8**

| No.                   | Nombre del Programa / Proyecto                                                                  | Meta                             | Unidad de Medida | Meta Global | Programado 2010 |                  | Ejecutado 2010   |             | Población Beneficiaria | Observaciones                                                                                                                                  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                 |                                  |                  |             | Anual           | Al III Trimestre | Al III Trimestre | % Ejecución |                        |                                                                                                                                                |
| 18                    | Construcción de la Departamental de Choluteca                                                   | Demolición, Diseño, Construcción | m2               | 700         |                 | -                | -                | -           | 443,416                | Contrato firmado y garantías presentadas, en trámite pago de anticipo, la orden de inicio será el 10 de octubre del año en curso.              |
| 19                    | Construcción/Remodelación Bodegas y Oficinas Administrativas de El Paraíso                      | Construcción de edificio         | m2               | 475         | 475             | -                | -                | -           | 409,598                | Proyecto en proceso licitación pública. Resolución No. 174-2010-SS con la Empresa AINCO                                                        |
| 20                    | Construcción/Remodelación Bodegas y Oficinas Administrativas de Intibucá                        | Construcción de edificio         | m2               | 873         | 305.55          | 305.55           | 185              | 60.5        | 226,227                | El contrato ya fue ratificado por el Soberano Congreso Nacional. (Decreto No.34) Pendiente pago de estimación de obra.                         |
| 21                    | Construcción/Remodelación Bodegas y Oficinas Administrativas de La Paz                          | Construcción de edificio         | m2               | 863         | 258.9           | -                | -                | -           | 187,177                | El contrato ya fue ratificado por el Soberano Congreso Nacional. Se emitió orden de inicio el día 31 de agosto de 2010. Avance Físico del 70%. |
| 22                    | Construcción/Remodelación Bodegas y Oficinas Administrativas de Lempira                         | Construcción de edificio         | m2               | 863         | 863             | -                | -                | -           | 300,107                | El contrato ya fue ratificado por el Soberano Congreso Nacional. Esta pendiente pago por estimacion de obra.                                   |
| 23                    | Construcción de las Oficinas Administrativas de la Región Departamental de Salud No.17 de Valle | Construcción de edificio         | m2               | 475         |                 | -                | -                | -           | 167,012                | Contrato firmado y garantías presentadas, en trámite pago de anticipo, la orden de inicio será el 10 de octubre del año en curso.              |
| 24                    | Construcción/Remodelación Bodegas y Oficinas Administrativas de la Departamental de Yoro        | Construcción de edificio         | m2               | 873         | 873             |                  |                  | -           | 532,752                | El contrato ya fue ratificado por el Soberano Congreso Nacional. Esta pendiente pago por estimacion de obra ejecutada.                         |
| <b>SECTOR PUBLICO</b> |                                                                                                 |                                  |                  |             |                 |                  |                  |             |                        |                                                                                                                                                |

Fuente: Unidad Ejecutora

## GOBIERNO DE HONDURAS

## SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas  
Institución: SECRETARIA DE SALUD (60)

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FISICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010

ANEXO No. 9

En Miles de Lempiras

| No.      | DEPARTAMENTAL/ NOMBRE DEL PROYECTO                                         | MUNICIPIO            | VIGENTE AL III TRIMESTRE 2010 |                  |                  | DEVENGADO III TRIMESTRE 2010 |                 |                 | DEVENGADO AL III TRIMESTRE 2010 |                  |                  | % Ejecución |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|
|          |                                                                            |                      | Nacionales                    | Externos         | Total            | Nacionales                   | Externos        | Total           | Nacionales                      | Externos         | Total            |             |
|          | <b>SECRETARIA DE SALUD</b>                                                 |                      | <b>128,179.8</b>              | <b>465,462.8</b> | <b>593,642.6</b> | <b>14,184.0</b>              | <b>74,638.2</b> | <b>88,822.3</b> | <b>28,351.6</b>                 | <b>250,374.1</b> | <b>278,725.7</b> | <b>47.0</b> |
| <b>1</b> | <b>ATLANTIDA</b>                                                           |                      | <b>6,000.0</b>                | <b>112,265.6</b> | <b>118,265.6</b> |                              |                 |                 |                                 | <b>100,905.0</b> | <b>100,905.0</b> | <b>85.3</b> |
| 1        | Construcción y Equipamiento del Hospital Atlántida                         | La Ceiba             | 6,000.0                       | 112,265.6        | 118,265.6        |                              |                 |                 |                                 | 100,905.0        | 100,905.0        | 85.3        |
| <b>1</b> | <b>COLON</b>                                                               |                      | <b>3,046.6</b>                |                  | <b>3,046.6</b>   |                              |                 |                 |                                 |                  |                  | <b>0.0</b>  |
| 1        | Sustitución del Techo del Hospital Dr. Salvador Paredes                    | Trujillo             | 3,046.6                       |                  | 3,046.6          |                              |                 |                 |                                 |                  |                  | 0.0         |
| <b>2</b> | <b>COPAN</b>                                                               |                      | <b>1,195.6</b>                | <b>23,931.2</b>  | <b>25,126.8</b>  | <b>32.7</b>                  | <b>1,752.1</b>  | <b>1,784.8</b>  | <b>32.7</b>                     | <b>5,293.5</b>   | <b>5,326.2</b>   | <b>21.2</b> |
| 1        | Mejoramiento del Nivel de Salud en Honduras                                | Santa Rosa de Copán  | 184.8                         | 13,761.1         | 13,945.8         |                              |                 |                 |                                 |                  |                  | 0.0         |
| 2        | Nutrición y Protección Social                                              | Todos los municipios | 1,010.9                       | 10,170.1         | 11,181.0         | 32.7                         | 1,752.1         | 1,784.8         | 32.7                            | 5,293.5          | 5,326.2          | 47.6        |
| <b>3</b> | <b>CHOLUTECA</b>                                                           |                      | <b>7,953.5</b>                | <b>46,834.7</b>  | <b>54,788.2</b>  | <b>1,436.8</b>               | <b>11,279.2</b> | <b>12,716.0</b> | <b>1,693.0</b>                  | <b>27,063.2</b>  | <b>28,756.2</b>  | <b>52.5</b> |
| 1        | Construcción de la Departamental de Choluteca                              | Choluteca            | 6,620.5                       |                  | 6,620.5          | 1,324.1                      |                 | 1,324.1         | 1,324.1                         |                  | 1,324.1          | 20.0        |
| 2        | Paquete Básico de Servicios de Salud con Gestión Descentralizada           | Todos los municipios |                               | 46,834.7         | 46,834.7         |                              | 11,279.2        | 11,279.2        |                                 | 27,063.2         | 27,063.2         | 57.8        |
| 3        | Atención Integral a Grupos Vulnerables                                     | Todos los municipios | 1,333.0                       |                  | 1,333.0          | 112.7                        |                 | 112.7           | 368.9                           |                  | 368.9            | 27.7        |
| <b>3</b> | <b>EL PARAISO</b>                                                          |                      | <b>8,782.1</b>                | <b>6,955.0</b>   | <b>15,737.1</b>  | <b>267.9</b>                 | <b>1,858.9</b>  | <b>2,126.8</b>  | <b>613.6</b>                    | <b>1,858.9</b>   | <b>2,472.5</b>   | <b>15.7</b> |
| 1        | Construcción/Remodelación Bodegas y Oficinas Administrativas de El Paraiso | Danlí                | 6,000.0                       |                  | 6,000.0          |                              |                 |                 |                                 |                  | 0.0              | 0.0         |
| 2        | Nutrición y Protección Social                                              | Todos los municipios | 1,449.1                       | 6,955.0          | 8,404.1          | 155.6                        | 1,858.9         | 2,014.5         | 244.8                           | 1,858.9          | 2,103.7          | 25.0        |
| 3        | Atención Integral a Grupos Vulnerables                                     | Todos los municipios | 1,333.0                       |                  | 1,333.0          | 112.3                        |                 | 112.3           | 368.8                           |                  | 368.8            | 27.7        |
| <b>5</b> | <b>FRANCISCO MORAZAN</b>                                                   |                      | <b>37,192.8</b>               | <b>54,215.5</b>  | <b>91,408.3</b>  | <b>6,452.7</b>               | <b>18,704.1</b> | <b>25,156.8</b> | <b>17,635.3</b>                 | <b>19,945.7</b>  | <b>37,581.0</b>  | <b>41.1</b> |
| 1        | Mejoramiento del Nivel de Salud en Honduras                                | Distrito Central     | 7,198.9                       | 10,025.9         | 17,224.8         | 2,480.5                      | 676.4           | 3,156.8         | 4,632.0                         | 676.4            | 5,308.4          | 30.8        |
| 2        | Paquete Básico de Servicios de Salud con Gestión Descentralizada           | Distrito Central     | 16,860.2                      |                  | 16,860.2         | 2,738.0                      | -               | 2,738.0         | 8,136.8                         |                  | 8,136.8          | 48.3        |
| 3        | Nutrición y Protección Social                                              | Distrito Central     | 4,421.2                       | 17,732.0         | 22,153.2         | 972.9                        | 554.6           | 1,527.6         | 2,322.6                         | 1,796.2          | 4,118.7          | 18.6        |
| 4        | Invirtiendo en la Gente, un País mas Saludable y con Mejor Educación       | Todos los municipios | 6,500.0                       |                  | 6,500.0          | 261.3                        | -               | 261.3           | 331.4                           |                  | 331.4            | 5.1         |
| 5        | Pro-Reforma del Sector Salud                                               | Distrito Central     | 2,212.5                       | 26,457.6         |                  |                              | 17,473.1        | 17,473.1        | 2,212.5                         | 17,473.1         | 19,685.6         | #¡DIV/0!    |

**GOBIERNO DE HONDURAS**  
**SECRETARIA DE FINANZAS**

Dirección General de Inversiones Públicas  
Institución: SECRETARIA DE SALUD (60)

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FISICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010

**ANEXO No. 9**

En Miles de Lempiras

| No.      | DEPARTAMENTAL/ NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                   | MUNICIPIO            | VIGENTE AL III TRIMESTRE 2010 |                 |                 | DEVENGADO III TRIMESTRE 2010 |                 |                 | DEVENGADO AL III TRIMESTRE 2010 |                 |                 | % Ejecución |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|          |                                                                                                                                                      |                      | Nacionales                    | Externos        | Total           | Nacionales                   | Externos        | Total           | Nacionales                      | Externos        | Total           |             |
| <b>3</b> | <b>GRACIAS A DIOS</b>                                                                                                                                |                      | <b>19,835.8</b>               |                 | <b>19,835.8</b> | <b>3,967.2</b>               |                 | <b>3,967.2</b>  | <b>3,967.2</b>                  |                 | <b>3,967.2</b>  | <b>20.0</b> |
| 1        | Construcción de la Primera Etapa de la Consulta Externa del Hospital Puerto Lempira, Mosquitia Hondureña                                             | Puerto Lempira       | 12,485.9                      |                 | 12,485.9        | 3,967.2                      |                 | 3,967.2         | 3,967.2                         |                 | 3,967.2         | 31.8        |
| 2        | Construcción de la Morgue en el Hospital Puerto Lempira, Mosquitia Hondureña                                                                         | Puerto Lempira       | 1,402.6                       |                 | 1,402.6         |                              |                 |                 |                                 |                 |                 |             |
| 3        | Construcción del Albergue para la Atención de Pacientes Conviviendo con el Virus de Inmuno Deficiencia Humana en Puerto Lempira, Mosquitia Hondureña | Puerto Lempira       | 5,947.3                       |                 | 5,947.3         |                              |                 |                 |                                 |                 |                 |             |
| <b>5</b> | <b>INTIBUCÁ</b>                                                                                                                                      |                      | <b>8,614.5</b>                | <b>71,627.9</b> | <b>80,242.3</b> | <b>525.2</b>                 | <b>13,445.6</b> | <b>13,970.8</b> | <b>1,286.1</b>                  | <b>29,435.7</b> | <b>30,721.8</b> | <b>38.3</b> |
| 1        | Construcción/Remodelación Bodegas y Oficinas Administrativas de Intibucá                                                                             | La Esperanza         | 4,380.2                       |                 | 4,380.2         |                              |                 |                 |                                 |                 |                 |             |
| 2        | Mejoramiento del Nivel de Salud en Honduras                                                                                                          | Intibucá             | 26.3                          | 12,487.5        | 12,513.8        |                              |                 |                 |                                 |                 |                 |             |
| 3        | Nutrición y Protección Social                                                                                                                        | Todos los municipios | 1,708.0                       | 7,255.6         | 8,963.6         | 111.3                        | 2,166.4         | 2,277.7         | 409.1                           | 2,166.4         | 2,575.4         | 28.7        |
| 4        | Control de Enfermedad de Chagas de la República de Honduras                                                                                          | Camasca              | 2,500.0                       | 5,050.0         | 7,550.0         | 413.9                        |                 | 413.9           | 877.0                           | 206.2           | 1,083.2         | 14.3        |
| 5        | Paquete Básico de Servicios de Salud con Gestión Descentralizada                                                                                     | Todos los municipios |                               | 46,834.8        | 46,834.8        |                              | 11,279.2        | 11,279.2        |                                 | 27,063.2        | 27,063.2        | 57.8        |
| <b>5</b> | <b>LA PAZ</b>                                                                                                                                        |                      | <b>6,851.3</b>                | <b>68,995.7</b> | <b>75,847.1</b> | <b>288.7</b>                 | <b>12,746.3</b> | <b>13,034.9</b> | <b>837.7</b>                    | <b>30,033.8</b> | <b>30,871.5</b> | <b>40.7</b> |
| 1        | Mejoramiento del Nivel de Salud en Honduras                                                                                                          | La Paz               |                               | 13,537.5        | 13,537.5        |                              |                 |                 |                                 |                 |                 |             |
| 2        | Construcción/Remodelación Bodegas y Oficinas Administrativas de La Paz                                                                               | La Paz               | 4,022.3                       |                 | 4,022.3         |                              |                 |                 |                                 |                 |                 |             |
| 3        | Nutrición y Protección Social                                                                                                                        | Todos los municipios | 1,495.0                       | 8,623.5         | 10,118.5        | 175.6                        | 1,467.1         | 1,642.6         | 469.4                           | 2,970.7         | 3,440.0         | 34.0        |
| 4        | Paquete Básico de Servicios de Salud con Gestión Descentralizada                                                                                     | Todos los municipios |                               | 46,834.8        | 46,834.8        |                              | 11,279.2        | 11,279.2        |                                 | 27,063.2        | 27,063.2        | 57.8        |
| 5        | Atención Integral a Grupos Vulnerables                                                                                                               | Todos los municipios | 1,334.0                       | -               | 1,334.0         | 113.1                        |                 | 113.1           | 368.3                           |                 | 368.3           | 27.6        |

## GOBIERNO DE HONDURAS

## SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas  
Institución: SECRETARIA DE SALUD (60)

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FISICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010

ANEXO No. 9

En Miles de Lempiras

| No.      | DEPARTAMENTAL/ NOMBRE DEL PROYECTO                                                                            | MUNICIPIO            | VIGENTE AL III TRIMESTRE 2010 |                 |                 | DEVENGADO III TRIMESTRE 2010 |                 |                 | DEVENGADO AL III TRIMESTRE 2010 |                 |                 | % Ejecución |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|          |                                                                                                               |                      | Nacionales                    | Externos        | Total           | Nacionales                   | Externos        | Total           | Nacionales                      | Externos        | Total           |             |
| <b>5</b> | <b>LEMPIRA</b>                                                                                                |                      | <b>8,407.1</b>                | <b>75,328.9</b> | <b>83,736.0</b> | <b>433.1</b>                 | <b>13,619.4</b> | <b>14,052.5</b> | <b>1,077.6</b>                  | <b>34,605.6</b> | <b>35,683.2</b> | <b>42.6</b> |
| 1        | Mejoramiento del Nivel de Salud en Honduras                                                                   | Gracias              | 150.0                         | 14,448.2        | 14,598.2        |                              |                 |                 |                                 |                 |                 |             |
| 2        | Construcción/Remodelación Bodegas y Oficinas Administrativas de Lempira                                       | Gracias              | 4,763.4                       |                 | 4,763.4         |                              |                 |                 |                                 |                 |                 |             |
| 3        | Nutrición y Protección Social                                                                                 | Todos los municipios | 993.7                         | 8,996.0         | 9,989.7         | 19.2                         | 2,340.2         | 2,359.4         | 200.6                           | 7,336.2         | 7,536.8         | 75.4        |
| 4        | Control de Enfermedad de Chagas de la República de Honduras                                                   | Cololaca             | 2,500.0                       | 5,050.0         | 7,550.0         | 413.9                        |                 | 413.9           | 877.0                           | 206.2           | 1,083.2         | 14.3        |
| 5        | Paquete Básico de Servicios de Salud con Gestión Descentralizada                                              | Todos los municipios |                               | 46,834.8        | 46,834.8        |                              | 11,279.2        | 11,279.2        |                                 | 27,063.2        | 27,063.2        | 57.8        |
| <b>1</b> | <b>OCOTEPEQUE</b>                                                                                             |                      | <b>1,433.1</b>                | <b>5,308.3</b>  | <b>6,741.4</b>  | <b>36.4</b>                  | <b>1,232.7</b>  | <b>1,269.1</b>  | <b>125.6</b>                    | <b>1,232.7</b>  | <b>1,358.3</b>  | <b>20.1</b> |
| 1        | Nutrición y Protección Social                                                                                 | Todos los municipios | 1,433.1                       | 5,308.3         | 6,741.4         | 36.4                         | 1,232.7         | 1,269.1         | 125.6                           | 1,232.7         | 1,358.3         | 20.1        |
| <b>2</b> | <b>OLANCHO</b>                                                                                                |                      | <b>4,600.3</b>                |                 | <b>4,600.3</b>  |                              |                 |                 |                                 |                 |                 |             |
| 1        | CAI- Construcción del Centro de Atención Integral para Pacientes Viviendo con VIH/SIDA Hospital San Francisco | Juticalpa            | 2,317.8                       |                 | 2,317.8         |                              |                 |                 |                                 |                 |                 |             |
| 2        | Ampliación y Reorganización de la Sala de Cirugía del Hospital San Francisco de Juticalpa, Olancho            | Juticalpa            | 2,282.5                       |                 | 2,282.5         |                              |                 |                 |                                 |                 |                 |             |
| <b>3</b> | <b>SANTA BARBARA</b>                                                                                          |                      | <b>3,443.8</b>                |                 | <b>3,443.8</b>  |                              |                 |                 |                                 |                 |                 |             |
| 1        | Remodelación de la Cocina del Hospital Santa Bárbara                                                          | Santa Bárbara        | 500.0                         |                 | 500.0           |                              |                 |                 |                                 |                 |                 |             |
| 2        | Reposición del Sistema de Agua Potable del Hospital de Santa Bárbara Integrado                                | Santa Bárbara        | 1,408.8                       |                 | 1,408.8         |                              |                 |                 |                                 |                 |                 |             |
| 3        | Reposición de Techos del Hospital Santa Bárbara                                                               | Santa Bárbara        | 1,535.0                       |                 | 1,535.0         |                              |                 |                 |                                 |                 |                 |             |

GOBIERNO DE HONDURAS

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas

Institución: SECRETARIA DE SALUD (60)

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FISICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010

ANEXO No. 9

En Miles de Lempiras

| No. | DEPARTAMENTAL/ NOMBRE DEL PROYECTO                                                               | MUNICIPIO | VIGENTE AL III TRIMESTRE 2010 |          |         | DEVENGADO III TRIMESTRE 2010 |          |       | DEVENGADO AL III TRIMESTRE 2010 |          |         | % Ejecución |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------|---------|------------------------------|----------|-------|---------------------------------|----------|---------|-------------|
|     |                                                                                                  |           | Nacionales                    | Externos | Total   | Nacionales                   | Externos | Total | Nacionales                      | Externos | Total   |             |
| 1   | VALLE                                                                                            |           | 4,980.1                       |          | 4,980.1 |                              |          |       |                                 |          |         |             |
| 1   | Construcción de las Oficinas Administrativas de la Región Departamental de Salud No. 17 de Valle | Nacaome   | 4,980.1                       | -        | 4,980.1 |                              |          |       |                                 |          |         |             |
| 1   | YORO                                                                                             |           | 5,843.1                       |          | 5,843.1 | 743.4                        |          | 743.4 | 1,082.9                         |          | 1,082.9 | 18.5        |
| 1   | Construcción/Remodelación Bodegas y Oficinas Administrativas de la Departamental de Yoro         | Yoro      | 5,843.1                       |          | 5,843.1 | 743.4                        |          | 743.4 | 1,082.9                         |          | 1,082.9 | 18.5        |

Fuente: SIAFI
